

CERTIFICADO DE PRUEBA HIDRAULICA
TCK202503016





000	14/03/2025	BASE TCK NEUQUÉN	GREEN OIL SERVICES	CERTIFICADO PH	M.LOZANO	D.VALLEJOS
Revisión	Fecha Insp.	Lugar	Cliente	Detalle	Revisó	Aprobó



MANGUERA FUEL & OIL
SUCTION AND DISCHARGE
3" x 240PSI(WP)

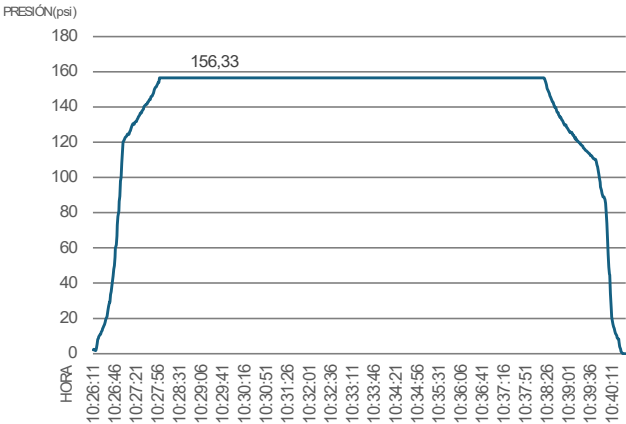

	CERTIFICADO DE PRUEBA HIDRAULICA	CERTIFICADO: TCK202503016			
		Fecha Insp.PH: 14/03/2025			
		Nueva Insp.PH: 14/03/2026			
DATOS GENERALES					
CLIENTE GREEN OIL SERVICES	LUGAR BASE TCK	EQUIPO / UNIDAD / IDENTIFICACIÓN MANGUERA FUEL & OIL SUCTION AND DISCHARGE 3" x 240PSI(WP)			
PROCEDIMIENTO N° TCK-PGPH-001	NORMA DE REFERENCIA API RP 53 - API 7K - API 16C	NORMA DE APLICACIÓN ASTM V ART9 / ASME E1003			
EQUIPOS UTILIZADOS					
TIPO DE EQUIPO UTILIZADO MANOMETRO REGISTRADOR DIGITAL	MARCA/MODELO CPG1500-WIKA	N° CERTIFICADO MAC GROUP 59514			
		CAL. / VEN. DEL INSTRUMENTO 21/02/25 - 21/02/2026			
IDENTIFICACION					
ITEM	DESCRIPCION	TRABAJO REALIZADO	PRESION DE PRUEBA	EVALUACIÓN	RESULTADO
1	MANGUERA FUEL & OIL SUCTION AND DISCHARGE (RYLTEC) 3" x 5m ACOUPLE RAPIDO ALUMINIO CAMLOCK 16bar/240psi (WP) 0096560/ GOS220702	IV-CD-PH 150psi-F. Insp. 03/25	150 psi	No se observa fugas fluidos visible, ni caída de presión. No se observa aplastamiento, deformación, abolladura y daños mecánicos. En condiciones para operación.	APTO
REGISTRO					
 					
REGISTRO FOTOGRAFICO					
					
OBSERVACIONES:					
Se realiza Inspeccion Visual de las condiciones de las mangueras sin encontrar aplastamientos, torceduras, quebraduras, o daños en el recubrimiento cercanos a los terminales; y de prensados-conexiones sin encontrar abolladuras o daños mecánicos. Se procede con la realización de prueba hidráulica (en serie) con agua a temperatura ambiente (18,8°C) en un tiempo de estabilización aproximado 10-15min, llegando a una presión de 156,33 PSI . No se observan deformaciones posterior a la prueba, ni fugas ni perdidas de fluidos visible durante el ensayo, ni caída de presión durante el registro (Data logger), segun norma de Refecencia API RP-53, API 7K y API 16C. Las manguera se encuentra en condiciones para puesta en servicio. RESULTADO SATISFACTORIO.					
Precinto	TCK202503016	0096560/ GOS220702	IV-CD-PH 150psi-F. Insp. 03/25		
OPERADOR			CONTROLLO		
LUGAR: NEUQUÉN FECHA: 14/03/2025  Laboratorio Calibración y Pruebas Técnico Lab D.Vallejos FIRMA / ACLARACIÓN:			LUGAR: NEUQUÉN FECHA: 14/03/2025  Control de Calidad y Operaciones Ing. M.Lozano FIRMA / ACLARACIÓN:		
QUEDA TERMINANTEMENTE PROHIBIDO LA REPRODUCCION PARCIAL O TOTAL DEL PRESENTE DOCUMENTO SIN SU PREVIA AUTORIZACION ESCRITA					Pag. 3 de 3
