

Serpentin

	PRUEBA HIDRÁULICA LÍNEA DE SERPENTIN				
	CERTIFICADO N°: MP-LH-23-021				
Ref: MP-OP-02-PH	Preparó: Silvio Ochoa	Aprobó: Sandro Mesplatere	Fecha: 13-06-2022	Rev. 2	

1.1 Datos Manguera

FECHA INICIAL: 20/04/2023 LONGITUD: N/A

PRECINTO N°: N/A DIAMETRO:


1.2 DATOS ADICIONALES

LUGAR FISICO: Equipo 105

PRESION DE PRUEBA: 950 PSI TIEMPO DE PRUEBA: 30 min


PROX. FECHA REVISIÓN: 19/04/2024

Presión vs Tiempo

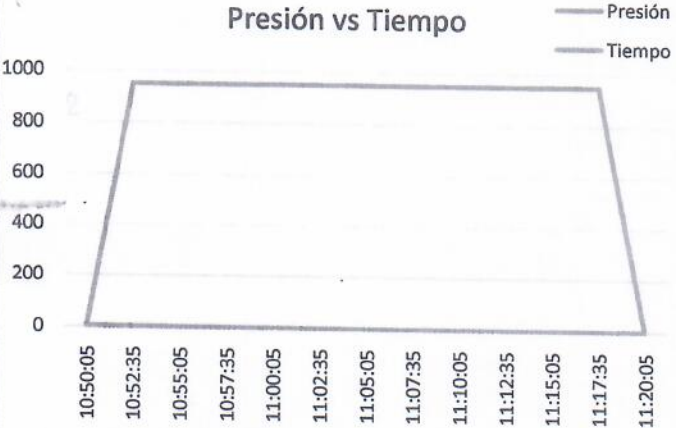

Tiempo	Presión (PSI)
10:50:05	950
10:52:35	950
10:55:05	950
10:57:35	950
11:00:05	950
11:02:35	950
11:05:05	950
11:07:35	950
11:10:05	950
11:12:35	950
11:15:05	950
11:17:35	950
11:20:05	0

Temperatura

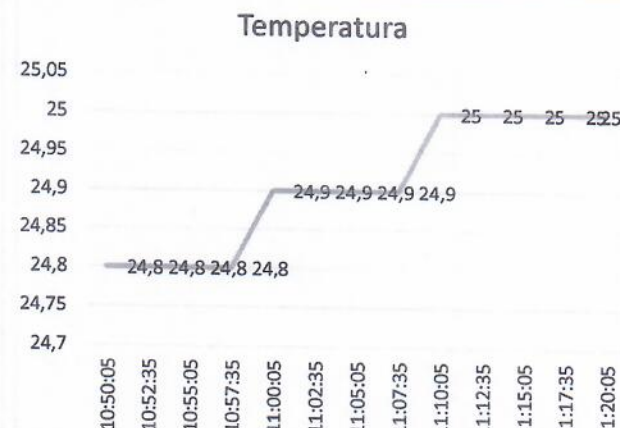


Tiempo	Temperatura (°C)
10:50:05	24.8
10:52:35	24.8
10:55:05	24.8
10:57:35	24.8
11:00:05	24.9
11:02:35	24.9
11:05:05	24.9
11:07:35	24.9
11:10:05	25.0
11:12:35	25.0
11:15:05	25.0
11:17:35	25.0
11:20:05	25.0



INSTRUMENTOS PATRONES:	Marca y Modelo	Rango de Lectura	N° Certificado	Fecha De Certificación
MANOMETRO DIGITAL	WIKA CPG 1500	0 - 1000 BAR	12522-11246	23/12/2022

Controlo
Mesplatere Sandro
Instrumentista



Aprobó
Silvio Dario Ochoa
Lic. Higiene y Seguridad, Mat. PA 0601

