

Fecha: 04-02-2016

Lugar: YACIMIENTO EL TORDILLO

Descripción : Instalaciones de planta de descarga

1. Planta de descarga



Ingreso de camiones a
planta

2. Estacionamiento de unidades livianas. Casilla de oficina-comedor, pañol



Ingreso a oficina, pañol

3. Pozo de efluentes cloacales



4. Sala de caldera





Reubicar productos
peligros en pañol

5. Pañol



6. Planta de descarga







7. INFORMACION ADICIONAL

INGRESO A PLANTA

- En cercanías a estacionamiento se encuentra recinto con transformador
- Se observa pozo de efluentes cloacales
- No hay cartelería de estacionamiento


CASILLA OFICINA-COMEDOR

- No cuenta con iluminación de emergencias
- Posee dos botiquines de primeros auxilios (uno ubicado en pañol y otro en oficinas)
- Posee heladera, microondas, termo tanque, calefacción por caloventor y aire acondicionado
- Posee comunicación radial y telefónica
- Roles de emergencia de accidente e incendio
- Documentación de seguridad, solo están los registros de capacitación
- No hay registro de última visita de consultora de higiene y seguridad
- Se observó muy buena limpieza de casilla comedor, oficina y baño
- Se observó buena limpieza en pañol. Falta ordenar

PLANTA DE DESCARGA

- Posee cartelería para las tareas de descarga
- Se observó conexión de PAT. Cartelería
- Se observaron dos tapas de inspección de cables rotas
- Contenedor de maniobras de entrada a gasoducto con puertas rotas
- No se observa punto de reunión
- No se observa señalización de salidas de emergencias

8. CROQUIS DE PLANTA DESCARGA

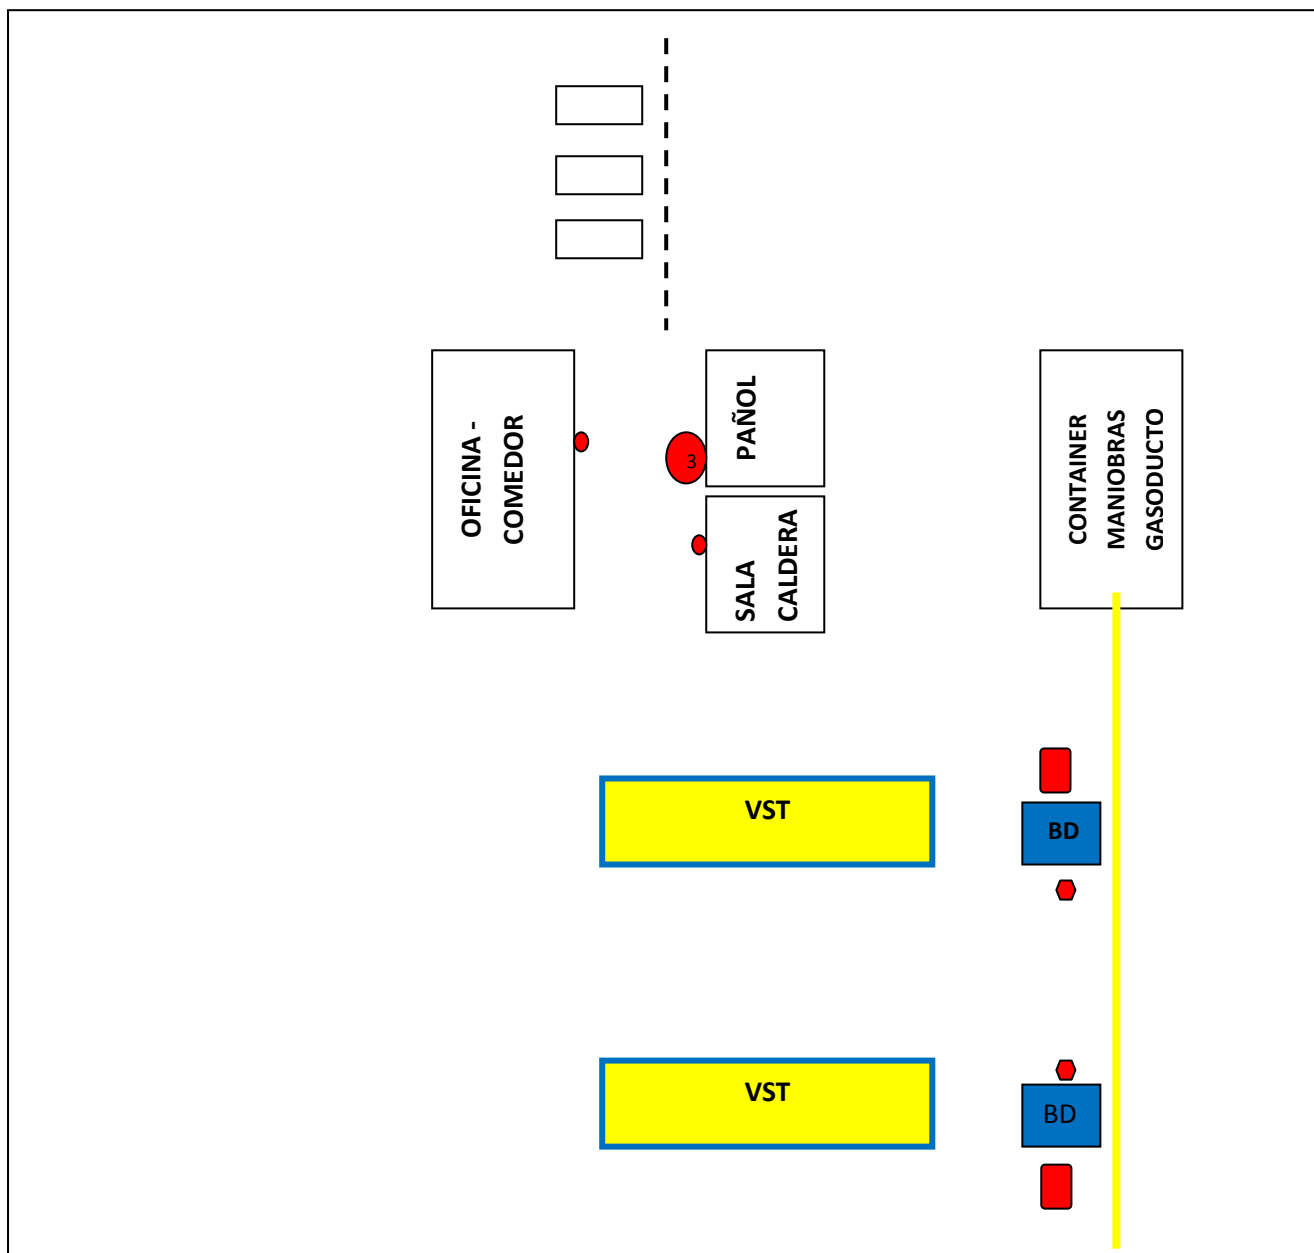

REFERENCIAS

--- Estacionamiento

● Extintores de 10 kg PQS ABC. Cantidad total: 5

● Extintores tipo carro x 25 kg PQS ABC. Cantidad total: 2

■ Extintores tipo carro x 70 Kg PQS ABC. Cantidad total: 2

BD Bahía de descarga

VST SEMI COMPUESTO
POR 3 MAT
